


Befaringsnotat – ekstremværet «Hans» - Dokka nord for Dokka bru – Nordre Land kommune

Sak:	2023				
Møtedato:	05.09.2023	Kl.:	14:00	Sted:	Dokka nord for Dokka bru
Til stede:	Nordre Land Kommune: Kjetil Fjeld, Ola Helstad, Ola Tore Dokken, Halvor Askvig NVE: Geir Bendik Hagen, Stine Therese Aksdal, Pauli Petter Nordvåg Statsforvalteren i Innlandet: Mari Olsen				

Fravær:					
Møteleder:	Geir Bendik Hagen (NVE)				
Referent:	Geir B. Hagen	Ref. dato.:	07.09.2023		
Saksnr.:	202312913	Arkiv:			
Kopi:					

Nr.	Dagsorden	Ansvar/dato
2023	Befaring av Dokkaelva nord Befaring av Dokkaelva nord fra Dokkabru langs vestre side opp til Dokka mølle.	

Dato for befarings: 05.09.2023	
Stedsnavn/XY koordinater: Dokka nord for Dokkabrua - østre side av elva	
Kort beskrivelse av skade/hendelsen: Erosjonsskader vestre elvekant mot bebyggelse og industriområde	
Annen bebyggelse/areal som (i etterkant av hendelsen) er utsatt for umiddelbar fare for skade ved neste intense regnskyll (dersom nåværende skader ikke istandsettes) (i tillegg til ovenfor)	
Antall boliger	3
Antall andre bygninger knyttet til boliger (garasje/uthus/annet*)	3
Areal uteområder (parkering/gårsplass/lekeplass/annet*)	Parkering ca. 200 m ²
Stort industriområde direkte utsatt for flom	
Dokka bru og Fv 2432 utsatt hvis erosjon langs vestre elvekant fortsetter	
Krisetiltak for istandsetting	
Oppsummering av behov for å begrense overhengende fare for mennesker og/eller store verdier (som faller innenfor NVEs sikringsansvar, dvs. boliger/næringsbygg)	
Stort behov	
Kort begrunnelse: Nord for Dokkabrua langs vestre side er det store erosjonsskader langs Dokka over en strekning på ca. 500 meter. Stort industriområde, Dokka bru og flere boliger er truet ved neste store flom i vassdraget.	
Er området/vassdraget tidligere sikret av NVE? Velg et element. Nei. Vestre elvekant ubeskyttet mot flom.	
NVEs tiltakskategori: K3. NVE gjennomfører krisetiltak	
Konklusjon befarings:	
Behov for et krisetiltak over en strekning på 500 m langs vestre side av elva Dokka nord for Dokkabrua. Stort industriområde, flere boliger og Dokka bru er direkte truet av flom. Elvekanten er totalt ubeskyttet mot neste flom. Elvekanten består av meget lett eroderbare masser.	
=> Krisetiltaket gjennomføres i regi av NVE hvor NVE står for 100% av kostnadene til prosjektering og bygging. Hovedentreprenør vil være NVE Anlegg.	
Rød strek viser krisetiltaket.	

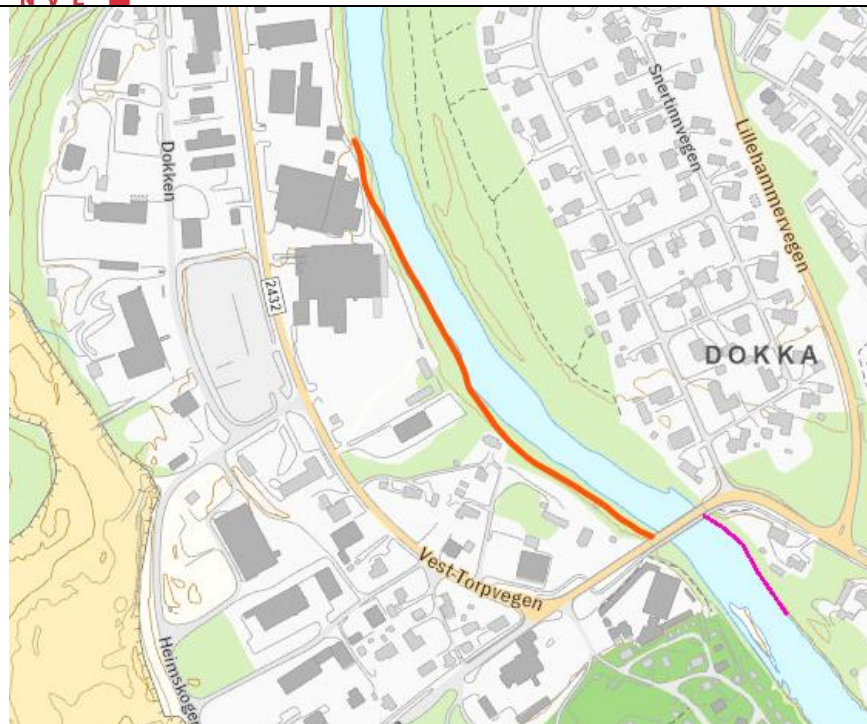

Anslått kostnad av NVE krisetiltak:

Kr 3 500 000,- ekskl. mva.

Bilde 1: Bratt erosjonskant. Meget lett eroderbare masser. Ubeskyttet elvekant.



Bilde 2: Fabrikkeier satte i gang et mindre krisetiltak under Hans. Reddet trolig fabrikken. Erosjonskanten før tiltaket gikk helt inntil asfaltkanten på bildet. Tiltaket består av alt for

liten stein og må bygges på nytt på strekningen.

